

REPORT

EXECUÇÃO DE PROJETOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÓPEBA (MG)

Nº 03 • Julho • 2026



1.FINALIZADOS

2.EM ANDAMENTO - TODA A BACIA DO PARAOPEBA

3.EM ANDAMENTO - MÉDIO PARAOPEBA


4.EM ANDAMENTO - BAIXO PARAOPEBA

5.EM BREVE



Rio Paraopeba

Nas páginas seguintes, serão apresentadas as demandas e os projetos desenvolvidos, bem como as próximas etapas previstas, os resultados já alcançados e uma prévia das iniciativas futuras. Essas ações têm como objetivo promover a sustentabilidade e a conservação da bacia hidrográfica em suas múltiplas dimensões, além de fortalecer o CBH Rio Paraopeba como uma instância legítima de representação dos interesses da população e dos diversos segmentos que dependem do rio para sua subsistência e para o desenvolvimento de suas atividades.



FINALIZADOS

- 01 AQUISIÇÃO DE DRONE PARA O CBH PARAOPEBA
- 02 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA DRONE DO CBH PARAOPEBA
- 03 PROCESSO DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL
- 04 AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS DO CBH PARAOPEBA
- 05 AQUISIÇÃO DE FACHADA PARA A SEDE DO CBH PARAOPEBA



FINALIZADOS

06

CONTRATAÇÃO DE OBRA DE AJUSTE DAS SALAS DA SEDE DO CBH PARAPEBA



TODA A BACIA DO PARAOPÉBA



EM ANDAMENTO



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE



LOCAL DE EXECUÇÃO
NÃO SE APLICA



EMPRESA CONTRATADA
TL PUBLICIDADE LTDA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
10/04/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 68.950,00



DURAÇÃO DO PROJETO
24 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JUNHO/26
R\$ 54.434,58



NÚMERO DO CONTRATO
023/2025





PRÓXIMAS ETAPAS
Contrato reduzido e encerrado. Administração do site transferida para a Partners.



FISCAL TÉCNICO APV
GISELE MARIA DA SILVA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



TODA A BACIA DO PARAÓPEBA



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSIONES)



LOCAL DE EXECUÇÃO
NÃO SE APLICA



EMPRESA CONTRATADA
GUERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
15/04/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 39.281,36



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES
1º Apostilamento em 14/05/2026



VALOR EXECUTADO ATÉ JUNHO/26
R\$ 14.830,02



NÚMERO DO CONTRATO
026/2025




PRÓXIMAS ETAPAS
Acompanhamento de demandas




FISCAL TÉCNICO APV
GISELE MARIA DA SILVA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



Contrato compartilhado entre o
CBHs estaduais Velhas, Paraopeba
e Pará)



CBH Rio das Velhas - Tanto Expresso | João Alves

EM ANDAMENTO



TODA A BACIA DO PARAÓPEBA



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO DO CBH PARAÓPEBA



LOCAL DE EXECUÇÃO
NÃO SE APLICA



EMPRESA CONTRATADA
PARTNERS COMUNICAÇÃO



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
24/03/2026



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 1.417.500,00



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JUNHO/26
R\$ 292.500,00



NÚMERO DO CONTRATO
016/2026




PRÓXIMAS ETAPAS
Acompanhamento de demandas



FISCAL TÉCNICO APV
MAURICIO VITOR OLIVEIRA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



EM ANDAMENTO



TODA A BACIA DO PARAÓPEBA



EM ANDAMENTO



CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS – PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS



LOCAL DE EXECUÇÃO

BACIAS DO RIO DAS VELHAS, PARÁ E PARAÓPEBA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

31/01/2025



DURAÇÃO DO PROJETO

24 MESES 1º Aditivo



NÚMERO DO CONTRATO

006/2025



FISCAL TÉCNICO APV

DIMAS SILVA



EMPRESA CONTRATADA

VN SOARES – VIAJE BEM MAIS



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 245.189,03 (1º Aditivo)



VALOR EXECUTADO ATÉ JUNHO/26

R\$ 106.229,85


28,97% referente ao CBH Paraopeba




PRÓXIMAS ETAPAS

Acompanhamento do contrato

PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



Contrato compartilhados entre os CBHs Estaduais (Velhas, Paraopeba e Pará).

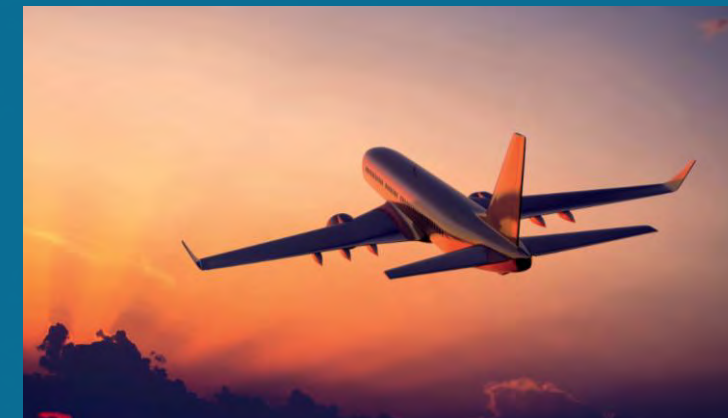

Imagens ilustrativas

TODA A BACIA DO PARAÓPEBA



EM ANDAMENTO



CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM OU SEM MOTORISTA



LOCAL DE EXECUÇÃO

BACIAS DO RIO DAS VELHAS, PARÁ E PARAÓPEBA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

10/02/2025



DURAÇÃO DO PROJETO

24 MESES – 1º Aditivo



NÚMERO DO CONTRATO

007/2025



FISCAL TÉCNICO APV

DIMAS SILVA



EMPRESA CONTRATADA

R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 278.203,20



VALOR EXECUTADO ATÉ JUNHO/26

R\$ 161.319,48


18,72% referente ao CBH Paraopeba



PRÓXIMAS ETAPAS

Acompanhamento do contrato

PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



Contrato compartilhados entre os CBHs estaduais (Velhas, Paraopeba e Pará).



Imagens ilustrativas

TODA A BACIA DO PARAÓPEBA



EM ANDAMENTO



CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS – FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES



LOCAL DE EXECUÇÃO

BACIAS DO RIO DAS VELHAS, PARÁ E PARAÓPEBA



EMPRESA CONTRATADA

R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

16/01/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 308.705,00



DURAÇÃO DO PROJETO

24 MESES



VALOR EXECUTADO

ATÉ JUNHO/26

0,00



NÚMERO DO CONTRATO

008/2025



PRÓXIMAS ETAPAS

Acompanhamento sob demanda




FISCAL TÉCNICO APV

DIMAS SILVA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



Contrato compartilhados entre os CBHs estaduais (Velhas, Paraopeba e Pará).



Imagens ilustrativas

TODA A BACIA DO PARAÓPEBA



EM ANDAMENTO



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGENS E LOCAÇÃO DE SALA PARA REUNIÃO



LOCAL DE EXECUÇÃO

BACIAS DO RIO DAS VELHAS, PARÁ E PARAÓPEBA



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

16/01/2025



DURAÇÃO DO PROJETO

24 MESES



NÚMERO DO CONTRATO

009/2025



FISCAL TÉCNICO APV

DIMAS SILVA



EMPRESA CONTRATADA

R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 115.288,98



VALOR EXECUTADO ATÉ JUNHO/26

R\$ 57.710,74


7,80% referente ao CBH Paraopeba





PRÓXIMAS ETAPAS

Acompanhamento sob demanda

PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO



Contrato compartilhados entre os CBHs estaduais (Velhas, Paraopeba e Pará).



Imagens ilustrativas

TODA A BACIA DO PARAÓPEBA



EM ANDAMENTO



AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO



LOCAL DE EXECUÇÃO
BACIA DO RIO PARAÓPEBA



EMPRESA CONTRATADA
FOCUN LOCAÇÕES



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
28/04/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 28.322,06



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JUNHO/26
R\$ 18.540,00



NÚMERO DO CONTRATO
029/2025






PRÓXIMAS ETAPAS
Acompanhamento sob demanda



FISCAL TÉCNICO APV
GISELE MARIA DA SILVA



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

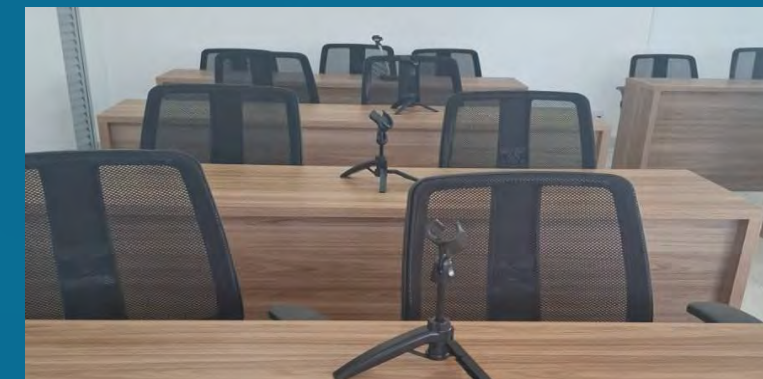

TODA A BACIA DO PARAÓPEBA



REALIZAÇÃO DE COLETAS E ANÁLISES PONTUAIS DE QUALIDADE DA ÁGUA E EXEMPLARES DE PEIXES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÓPEBA



LOCAL DE EXECUÇÃO
BACIA DO RIO PARAÓPEBA



EMPRESA CONTRATADA
SENAI/DRMG



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)
29/09/2025



VALOR GLOBAL DO CONTRATO
R\$ 721.533,11



DURAÇÃO DO PROJETO
12 MESES



VALOR EXECUTADO ATÉ JUNHO/26
R\$ 23.932,75



NÚMERO DO CONTRATO
063/2025





PRÓXIMAS ETAPAS
Acompanhamento do contrato



FISCAL TÉCNICO APV
KELE ROCHA FIRMIANO



PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

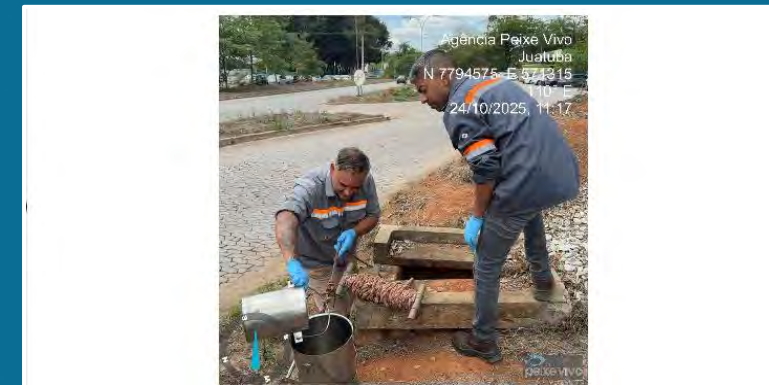

EM ANDAMENTO



EM ANDAMENTO




Fortuna de Minas (Córrego dos Macacos),
Florestal e Pará de Minas (Ribeirão do
Ouro)



Dr. David A. Clark

65%

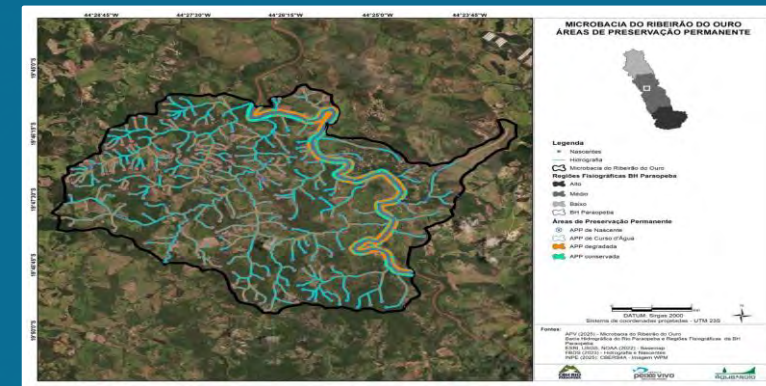

BAIXO PARAÓPEBA



CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA EM MICROBACIA DO RIO PARAÓPEBA – BAIXO PARAÓPEBA



LOCAL DE EXECUÇÃO

Curvelo (Córrego Falcão e Almas) e Pompéu (Córrego Capitão do Campo)



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

05/01/2026



DURAÇÃO DO PROJETO

08 MESES



NÚMERO DO CONTRATO

081/2025



FISCAL TÉCNICO APV

PAULO SÉRGIO



EMPRESA CONTRATADA

GAMA ENGENHARIA E RECURSOS HÍDRICOS LTDA



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 655.519,87



VALOR EXECUTADO

ATÉ JUNHO/26



R\$ 426.087,92



PRÓXIMAS ETAPAS

Entrega do Produto 5

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO

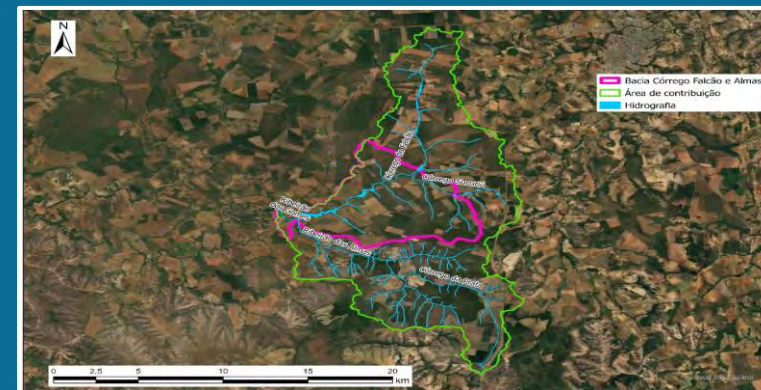

EM ANDAMENTO



ALTO PARAPEBA



EM ANDAMENTO



CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PROJETOS INDIVIDUAIS POR PROPRIEDADE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA EM MICROBACIA DO RIO PARAPEBA – ALTO PARAPEBA



LOCAL DE EXECUÇÃO

Congonhas (Córrego Santo Antônio e Rio Maranhão) e Ouro Branco (Ribeirão Varginha)



DATA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO (OS)

23/06/2026



DURAÇÃO DO PROJETO

08 MESES



NÚMERO DO CONTRATO

036/2026



FISCAL TÉCNICO APV

PAULO SÉRGIO



EMPRESA CONTRATADA

ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS LTDA



VALOR GLOBAL DO CONTRATO

R\$ 688.138,14



VALOR EXECUTADO

ATÉ JUNHO/26

R\$ 0,00



PRÓXIMAS ETAPAS

Reunião inicial

PERCENTUAL
DE EXECUÇÃO





- 01** AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A SEDE DO CBH PARAÓPEBA – **PREVISÃO DEZEMBRO DE 2026**
- 02** AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO OU OUTRO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA A SEDE DO CBH PARAÓPEBA – **PREVISÃO JANEIRO DE 2027**
- 03** CONTRATAÇÃO DE ESTANDE E BRINDES PARA O ENCOB 2026 – **PREVISÃO NOVEMBRO DE 2026**
- 04** AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS DO CBH PARAÓPEBA – **PREVISÃO NOVEMBRO DE 2026**

EXPEDIENTE

CBH DO RIO PARAÓPEBA

Heleno Maia Santos Marques do Nascimento
Presidente

Natália de Vasconcelos Soares Aleixo
Vice-presidente

Guilherme da Silva Oliveira
Secretário

Andréa de Oliveira
Secretária Adjunta

AGÊNCIA PEIXE VIVO


Rúbia Santos Barbosa Mansur
Diretora Geral

Berenice Coutinho Malheiros dos Santos
Gerente de Administração e Finanças

Jacqueline Evangelista Fonseca
Gerente de Projetos

Ohany Vasconcelos Ferreira
Gerente de Integração

Mauricio Vitor Oliveira
Analista de Projetos
Produção, diagramação e revisão final



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÓPEBA

Rua Inconfidência, 254, Centro, Betim (MG)

CEP: 32600-100 | (31) 3207-8500

www.cbhparaopeba.org.br | @cbhparaopeba

AGÊNCIA PEIXE VIVO

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro, Belo Horizonte (MG)

CEP 30.120-060 | (31) 3207-8500

www.agenciapeixevivo.org.br | @agenciapeixevivo
